

COA Albergen

Rondgang gemeente en veiligheidsregio

Datum 28-08-2024 om 13.00

2^e verdieping

Ruimte 2.16 badkamer

Vlinderklep plaatsen in de afvoer ventilatiekanaal doucheruimte.

Overige doucheruimtes ook 2.05 – 2.06 – 2.07 -2.08 – 2.14 en 2. 15



Foto voor



Foto NA

Gaten dichtmaken met brandwerende kit.

Alle ruimtes 2^e verdieping de plafonds nalopen en waar nodig brandwerende kit aanbrengen.



Foto voor



Foto na

Ruimte 2.10 Technische ruimte

Onderzijde koof zit een brandklep en deze dient verplaatst te worden of de 2 kanalen aftimmeren met brandwerende beplating en afkitten brandwerende kit zodat de brandscheiding wordt verlegd.

Advies veiligheidsregio

1 meter vanaf de verdiepingvloer zal het kanaal moeten worden ingepakt met brandwerende bekleding (60min WBDBO)



Foto voor



Foto na

Ruimte 1.10 – opslag

De fermacell beplating 1^e verdieping geheel aftimmeren met roze brandwerende gipsplaten en rondom afkitten brandwerende kit



Foto voor



Foto na

Ruimte 0.11 Kantoor

Tijdens de rondgang kon veiligheidsregio niet achterhalen hoe de opbouw was van deze wand.

Advies: deze wand opnieuw bekleden ivm met het halen van de 60 min WBDBO met brandwerende beplating en brandwerende kit



Foto voor



Foto na

Deur naar naar de Vide vanuit ruimte 2.23 slaapkamer

Deur dicht zetten met brandwerende beplating en afkitten ivm brandscheiding



Foto Voor



Foto Na

Ruimte 2.33 – 2.31 Gang

Deur van de hal dichtzetten met brandwerende beplating en afkitten ivm brandscheiding



Foto voor



Foto Na

Ruimte 2.21 - douche

Plafond aftimmeren met brandwerende beplating en rondom afkitten met brandwerende kit.
Afvoerkanaal van de ventilatie voorzien van een vlinderklep.



Foto voor



Foto na

Ruimte 2.22 – douche

Plafond aftimmeren met brandwerende beplating en rondom afkitten met brandwerende kit.
Afvoerkanaal van de ventilatie voorzien van een vlinderklep



Foto voor



Foto na

Ruimte 1.27 - slaapkamer

Kozijn voorzien van brandwerende beglazing en deur dichtzetten met brandwerende beplating en brandwerende kit.



Foto voor



Foto na

Platdak

De afzuiginstallatie van de keuken is door Witte Veen en Bos een nieuwe vergunningsaanvraag ingediend bij de gemeente.



Ruimte 1.18 - gang

Vliesgevel aan de binnenzijde dichtzetten met brandwerende beplating en brandwerende kit.



Foto voor



Foto na

Buitenzijde tpv entree

Vanwege brandoverslag zal de Trespa beplating moeten worden verwijderd en brandwerend worden bekleed en eventueel de Trespa beplating opnieuw worden aangebracht.



Foto voor



Foto na

Ruimte 1.41 - gang

Naden en randen nalopen en waar nodig afkitten met brandwerende kit,

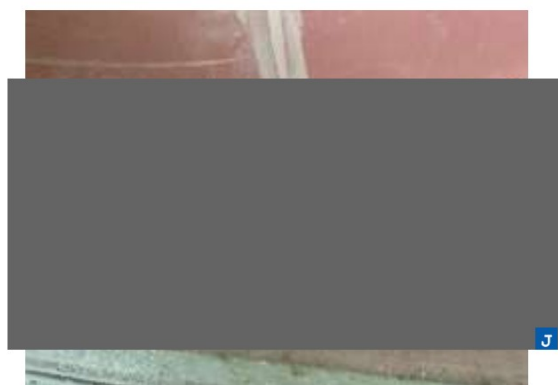


Foto voor



Foto na

Ruimte 0.10 - kantine

Deur kantine keuken zal een brandwerende deur moeten worden geplaatst van 60min WBDBO.
Er zit nu een deur geplaatst van 30 min WBDBO

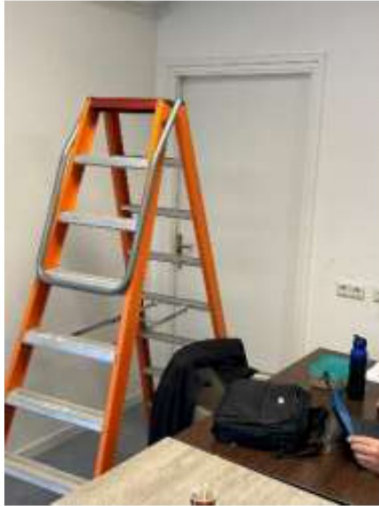


Foto voor



Foto na

Algemeen.

Alle deurcilinders in de brandscheiding voorzien cilinders en de deuren in de brandscheidingen voorzien van deurdrangers

Aanslag van de deurkozijnen moeten 25 mm zijn uitgevoerd ivm het behalen van de 60 min WBDBO



Foto voor

Nog geen foto na

Kelder

Ruimte -1.17 - Gang

Er is 1 deur aanwezig die 60 min brandwerend is en andere deur op korte termijn niet leverbaar. Deze deur zal worden geplaatst en de andere deur zal tijdelijk worden aangepast dat deze 60 min brandwerend is uitgevoerd door middel van brandwerende beplating op de deur monteren.



Foto voor



Foto na



Ruimte -1.11 Gang

Schroef zal uit het slot moeten worden gehaald



Foto voor



Foto na

Ruimte -1.11 Gang

Screen verwijderen ivm vluchtweg.



Foto voor



Foto na

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen
